全公司消防应急及三级防控演练

5月17日下午13点公司热媒炉房发生火灾，全体工作人员到安全集合点集合，点名确保没有遗漏人员

因使用消防水火火，消防废水超出车间范围到达雨水管，指挥部发出三井防控二级预警，事故处理组人员立即确认雨水总排口阀门是否关闭，确认阀门有无泄漏，如有泄漏，再用橡皮阻塞球进行堵漏

密切关注消防废水应急池液位情况

因消防污水含有大量油污，公司水处理设施无法处理，将消防污水应急池提送泵阀门切换到污水应急池收集

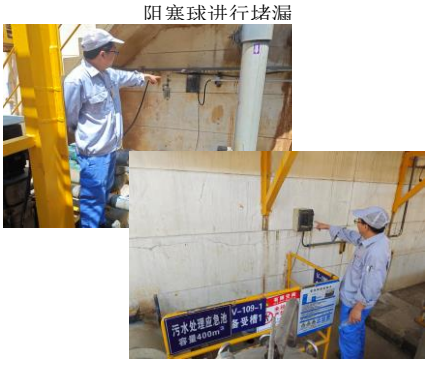

密切关注污水应急池液位，如应急池有无法受纳全部污水，污水可能会流出到厂外的趋势（流到周泾浜），通讯组要立即通知无锡市新吴区突发环境事件应急指挥中心，启动三级防控预警

发现应急池可能无法受纳全部污水，事故处理组如有立即切断污水总排口阀门，确认无泄漏，准备将污水应急池内污水提升到水处理设施储存

最终因公司应急池容量充足，受纳了全部污水，污水没有外溢，不用启动三级防控，将污水委外处理，清洗各处受污管道，提取水样检测合格后恢复正常运行状态

消防指导人员教育员工如何使用灭火器

员工使用灭火器进行灭火操作

消防指导人员教育员工如何使用消防水

员工进行消防水管接拆操作

部分管路上标识因时间长，标识内容无法辨识，需要更换
